



PLL i nord

Styringsgruppemøte 22. januar 2025



Agenda

1-2025: Godkjenning av innkalling og referat

2-2025: Orienteringssak: Overordnet prosjektstatus

3-2025: Orienteringssak: Leverandør-/systemstatus

4-2025: Beslutningssak: Start utprøving

Vedlegg: ([Ligger på nettsiden vår - klikk her](#))

- Referat fra forrige møte
- Sak 3-2024 (tilhører beslutningssak 4-2025)

Godkjenning av innkalling og referat

Saksbeskrivelse

- Innkalling til dette møtet
- Referat fra forrige møte

Forslag til vedtak:


Styringsgruppen
godkjenner innkalling
og referat fra forrige
styringsgruppemøte



2-2025: Overordnet prosjektstatus

Orienteringssak

Troms og Ofoten først ut med fastlegene, resten følger hakk i hæl

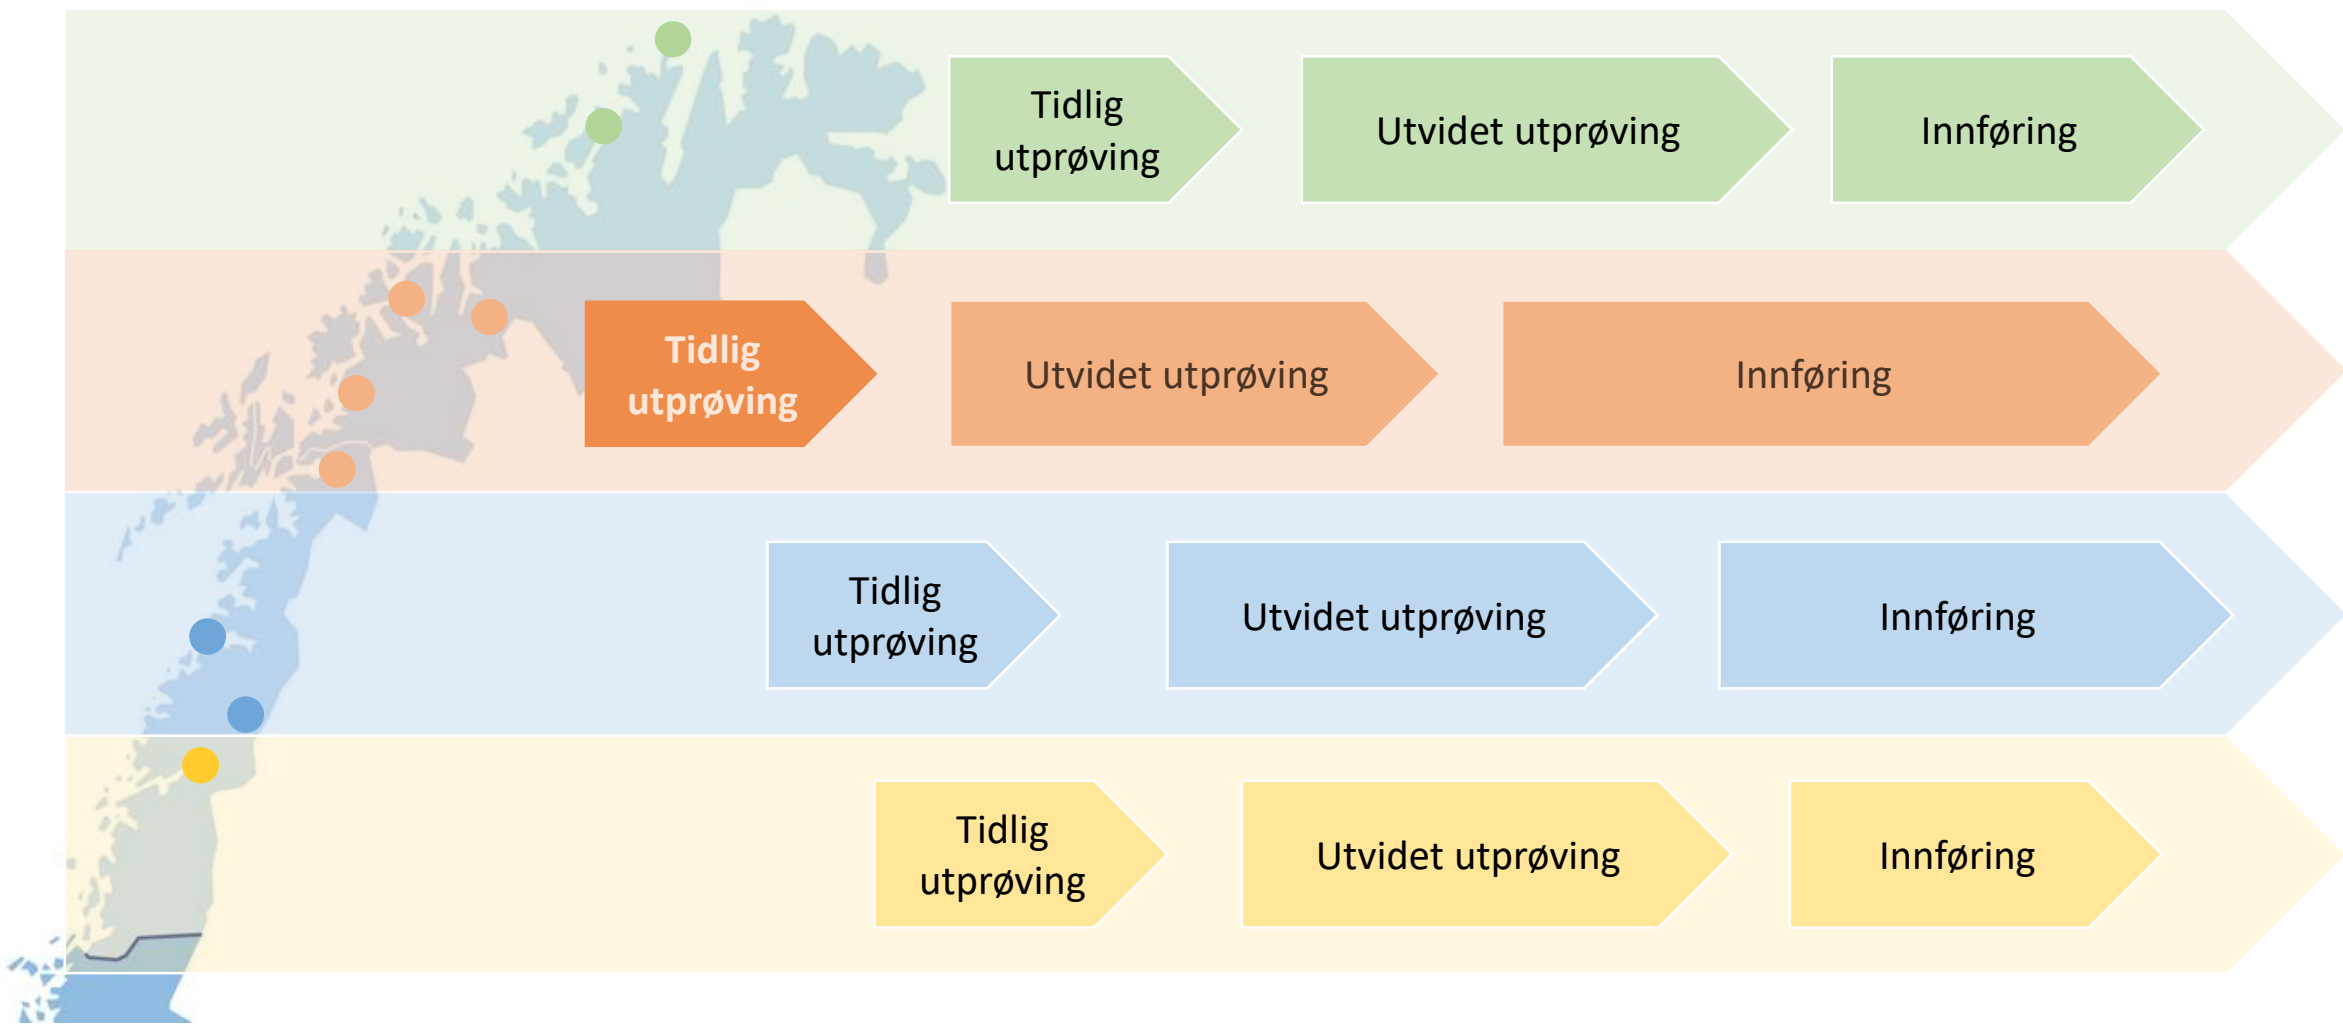

Fremdrift og forberedelser – fastlegen først

Forberedelser til utprøving hos fastleger pågår i alle delområder

- Støtte i EPJ-systemene: få på plass SFM
- Apotek: etablering av eMD apotek
- Informasjon, opplæring og oppstartstøtteplanlegging

Overordnet fremdrift

- Troms & Ofoten starter først med 2 legekantor (ca 15 leger) 3. februar
- Legekantor i alle delområder gjør seg klare til å starte fortløpende i Q1/Q2
- Delområdene melder om noen forsinkelser grunnet problemer med systemoppgradering og manglende eMD-apotek (bl. a. grunnet innføring av EIK i apotekene)

Fremdrift og forberedelser – sykehus

PLL i DIPS
Trinn 1

Tilkopling SFM

- Utprøving pågår i alle helseforetakene
- Evaluering 20.-31. Januar
- Bredding siste halvdel av februar 2025

PLL i DIPS
Trinn 2


Full støtte for PLL

- Utvikling av løsning pågår pt
- Akseptansetest NHN starter 17. februar
- Utprøving i sykehusene Q2 2025 (mai)

Evaluering pågår i sykehusene

Hvor mye tid sparer du i den nye løsningen?


- 0-5 minutter 1
- 5-10 minutter 1
- 10-15 minutter 2
- 15-20 minutter 1
- over 20 minutter 0

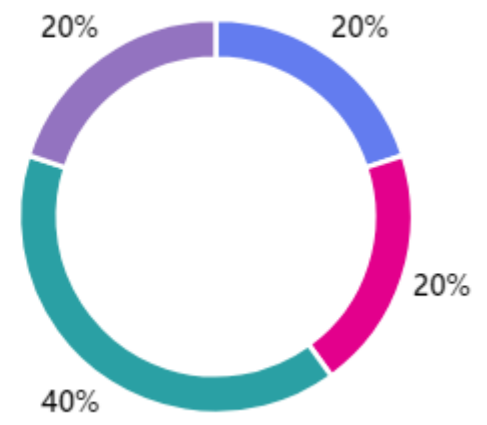


Legemiddelhåndtering er utfordrende i en akutt setting hvor man har dårlig tid; det er sjelden tid til å sjekke Reseptformidleren og Kjernejournal, kontakte kommunen og snakke med pasient og pårørende. Den nye løsningen vil drastisk forenkle jobben, spare tid og minske risikoen for feil.

Overlege akuttmottak UNN


Parallele forberedelser i sykehus, hos fastleger og kommuner

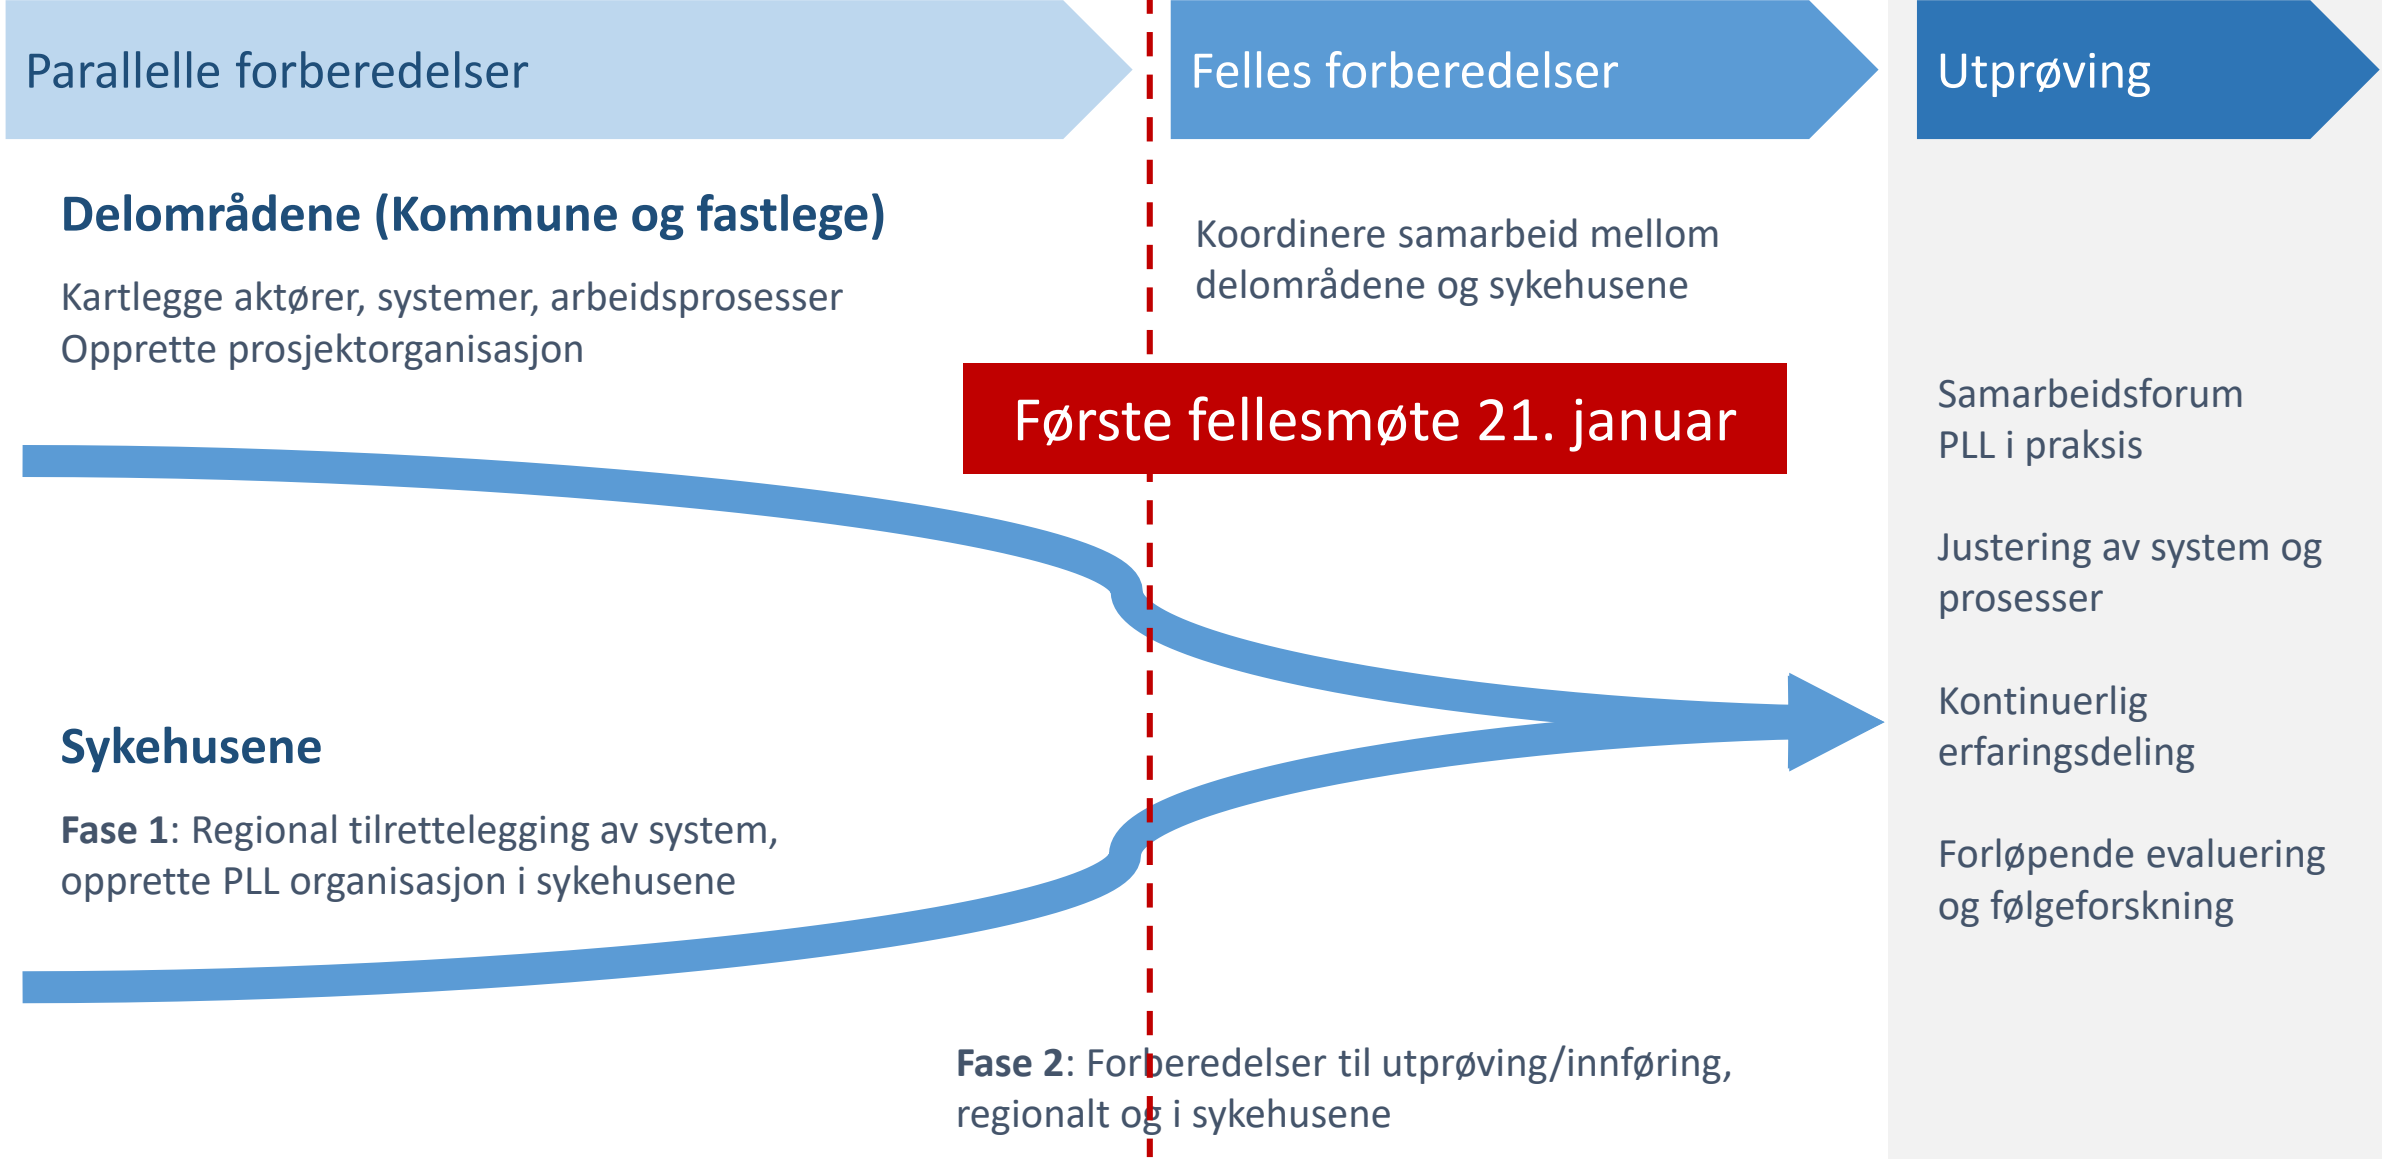

Hvordan pusle sammen alle bitene ... med håndterbar risiko?



Risiko – overordnet

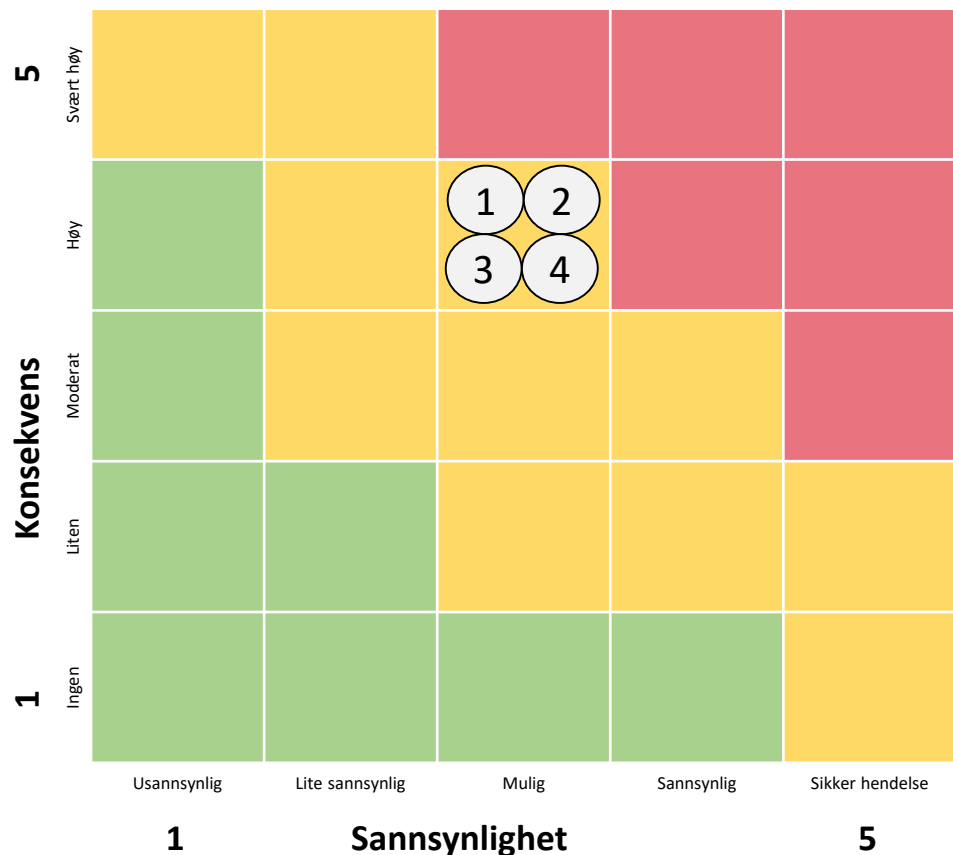

| Nr | Risikoområder |
|----|---|
| 1 | Ressurser 1.1 Finansiering av delområde, sykehus og regionalt prosjekt 1.2 Kapasitet hos aktørene som tar i bruk PLL 1.3 Tilgjengelige ressurser / kompetanse for opplæring / oppfølging i prosjektene |
| 2 | Leverandører 2.1 Godkjenning av systemer for PLL 2.2 Kapasitet til oppfølging og support |
| 3 | E-multidose 3.1 Prioritering / Etablering av eMD apotek 3.2 Uavklarte ansvarsforhold |
| 4 | Utprøving 4.1 Ustabilitet / treghet / prodsettingsproblemer 4.2 Div tekniske forhold i prod |

Risikoreduserende tiltak – overordnet

- Redusere avhengigheter og kompleksitet: Fastlegen først + forenkling av løsning for sykehusene
- Alle delområdeprosjektene har søkt HTO-midler fra HDIR (frist 15. Januar)
- Delområde- og sykehusprosjektene er oppfordret til å søke Rekruttering -og samhandlingstilskudd fra HOD
- Smidig og effektiv innføringsmodell for å redusere totalt ressursbehov
- Tett dialog, koordinering og samarbeid mellom aktørene alle nivåer

→ *Prioritering av ressurser til prosjektet på alle nivåer*

Overordnet prosjektstatus PLL i nord

Saksbeskrivelse

- Fremdrift og forberedelser
- Risiko – overordnet

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen tar orienteringen til etterretning





















3-2025 Status leverandører og systemer

Orienteringssak

Status SFM Fastlegesystemene

-  Godkjent
-  I prosess
-  Ikke startet

Godkjenningsregime hos NHN: akseptansetest, utprøving og innføring.
Ihht NHNs plan skal systemene under være godkjent ila Q1 2025

| Systemleverandører EPJ Fastleger, avtalespesialister og legevakt | Tidspunkt Akseptansetest | Status Akseptansetest | Status Utprøving | Status Innføring |
|---|-----------------------------|---|---|---|
| EG Pasientsky | Fullført |  |  |  |
| EG Infodoc | Q1 2025 |  |  |  |
| WebMed | Fullført |  |  |  |
| CGM | Fullført |  |  |  |
| Pridok e-multidose (egen modul, ikke SFM) | Fullført |  |  |  |
| Pridok PLL (egen modul, ikke SFM) | Q1 2025 |  |  |  |

Status SFM Sykehussystemet

Godkjenningsregime hos NHN: akseptansetest, utprøving og innføring.
Ihht NHNs plan skal DIPS være godkjent ila Q1 2025

-  Godkjent
-  I prosess
-  Ikke startet

| Systemleverandører EPJ Sykehus | Tidspunkt Akseptansetest | Status Akseptansetest | Status Utprøving | Status Innføring |
|---|--------------------------|---|---|---|
| DIPS Arena Medikasjon trinn 1 – SFM tilkobling | Fullført |  |  |  |
| DIPS Arena Medikasjon trinn 2 – full PLL støtte | Q1 2025 |  |  |  |

Status SFM PLO-systemene

Godkjenningsregime hos NHN: akseptansetest, utprøving og innføring. Ihht NHNs plan skal Visma og TietoEvry være godkjent ila Q1 2025.

-  Godkjent
-  I prosess
-  Ikke startet

| Systemleverandører EPJ Sykehjem, hjemmetjenester, KAD | Tidspunkt Akseptansetest | Status Akseptansetest | Status Utprøving | Status Innføring |
|--|-----------------------------|--|--|--|
| Visma Profil / Flyt | Q1 2025 |  |  |  |
| Tieto Evry Gerica | Q1 2025 |  |  |  |
| DIPS Front CosDoc | Uavklart |  |  |  |

Status NHN Sentral forskrivningsmodul (SFM)

- Godkjent for fastlegesystemer 2024
- Godkjennes for sykehus når PLL i DIPS godkjennes (plan Q1 2025)
- SFM for PLO-systemer skal godkjennes i 2025
 - Plan og scope besluttet i operativ styringsgruppe for SFM Q1 2025
 - Godkjenningssprosess tilsvarende prosess for fastlegesystemene
 - Tidlig utprøving pågår i noen kommuner
- SFM for PLO skal videreutvikles ihht identifisert utviklingsbehov i 2025

Status leverandører og systemer

Status for systemer som er nødvendige for utprøving av PLL:

- Fastlegesystemer
- Sykehussystemer
- PLO-systemer
- SFM

Forslag til vedtak:


Styringsgruppen tar orienteringen til etterretning



4-2025 Start utprøving

Fastlegen først - Beslutnings sak

Rekkefølge

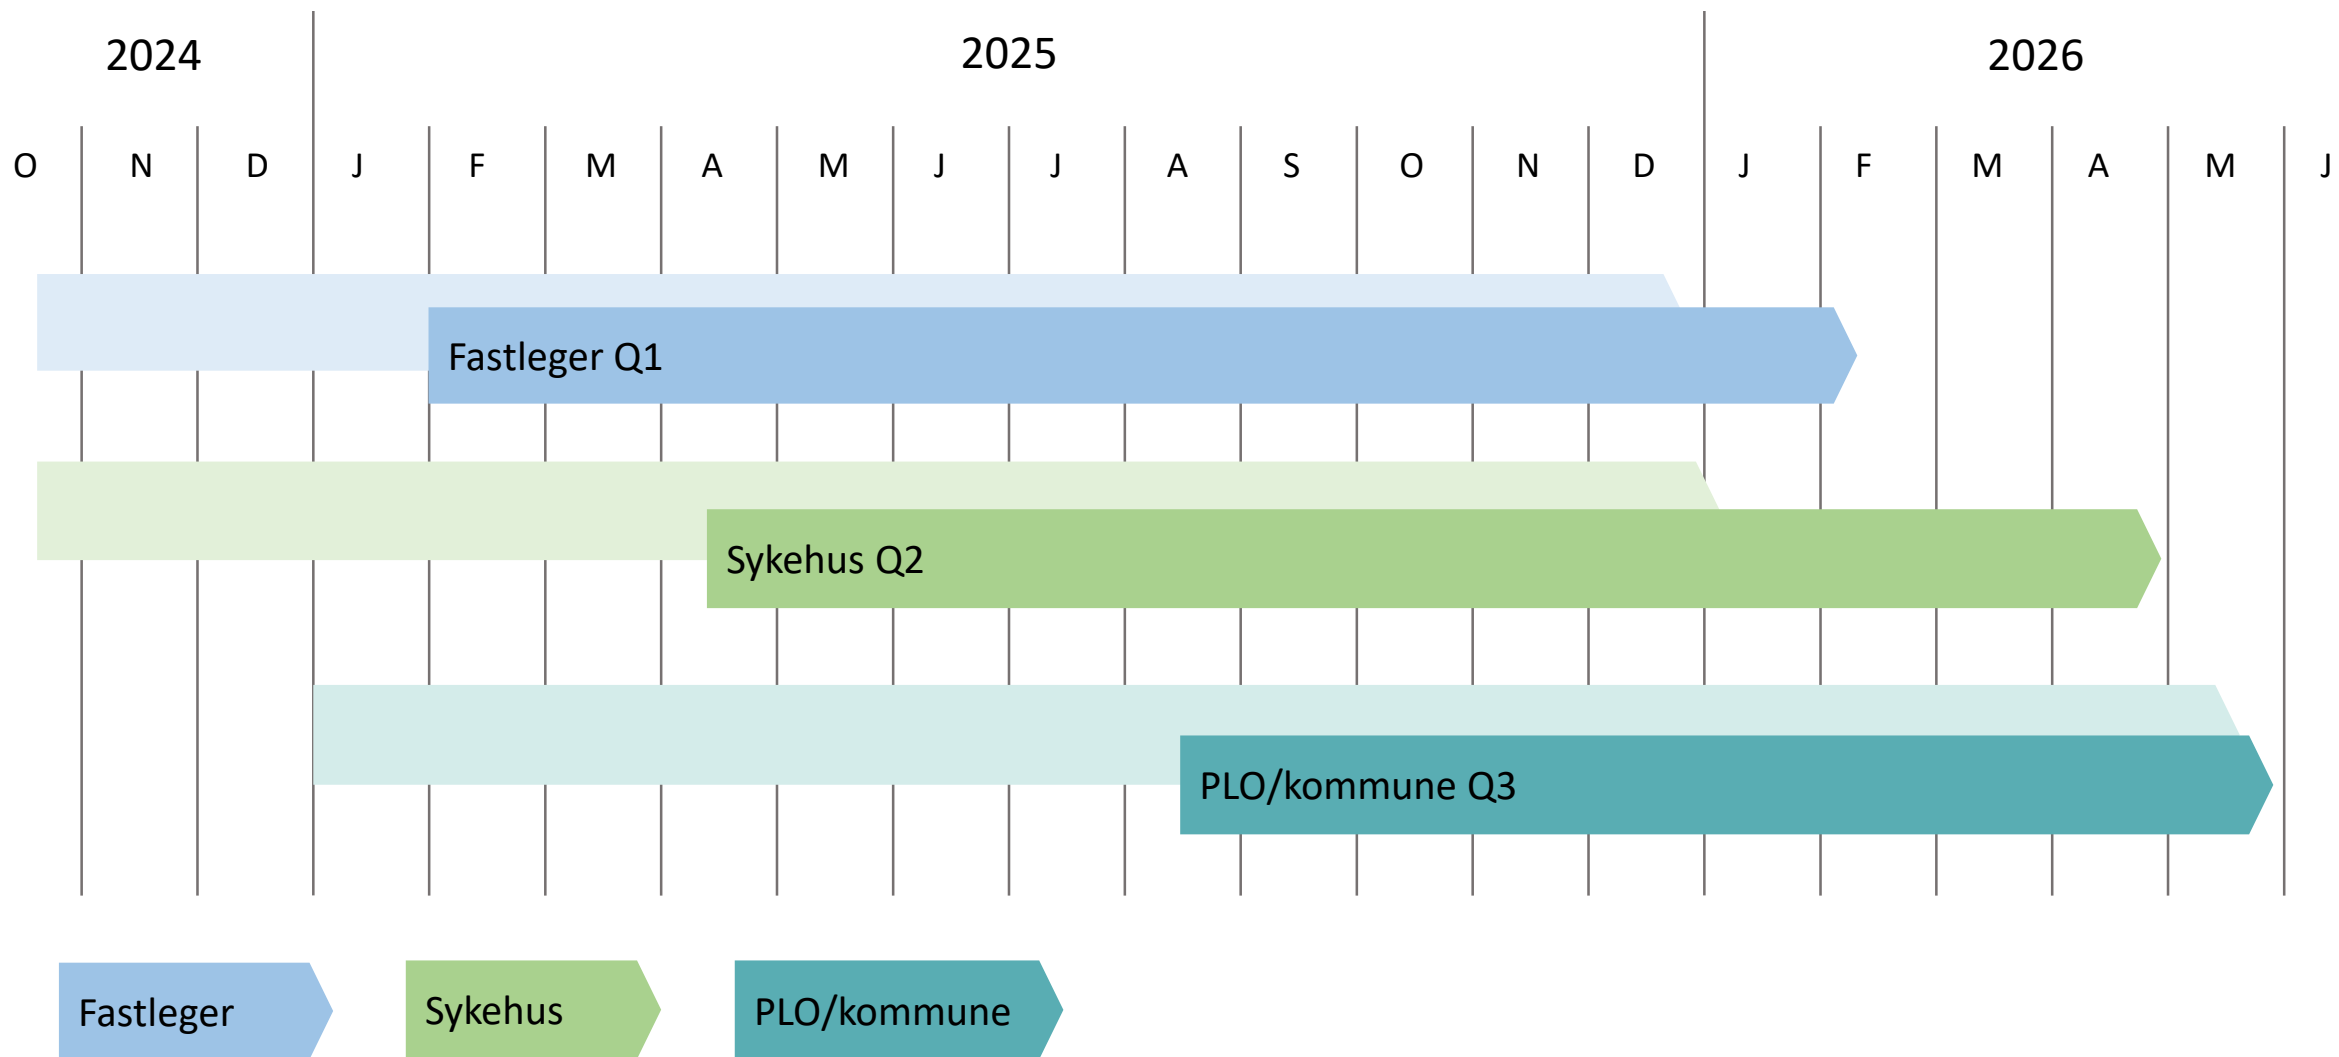

Godkjenning start utprøving

PLL i nord anbefaler at utprøving i tråd med utprøvningsstrategien "Fastlegen først" starter som planlagt 3. februar

- Opplæringsopplegg for ibruktagelse av PLL er utarbeidet
- Struktur for oppfølging etter oppstart er etablert

- 2 fastlegekontor, totalt ca 15 leger, i Troms og Ofoten er forberedt og klare til å starte 3. februar
- Utvalgte fastleger i alle delområdene er i gang med forberedelser og kan starte så fort de første legene i T&O er i gang og utfordringer er avklart

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen godkjenner og stiller seg bak utprøvningsstart 3. februar

Evt forbehold referatføres



Lagspill

heidi.johansen@helsenord.no
www.helse-nord.no/pll
